

Generálkivitelező: Gépész Centrál Kft.

Az ellenőrzést végezte: Kispéter Ákosné

Dátum: 2026. 05. 11.

Megfelelt: ✓ Nem felelt meg: X

Az együttműködés előmozdítása érdekében tett intézkedések

- beléptetés megoldása ✓
- generálkivitelező FMV a helyszínen ✓
- BEK bejárás heti 1 alkalommal ✓
- ellenőrzési tapasztalatok megküldése és a megelőzés számonkérése ✓
- különböző munkáltatók tevékenységének összehangolása építésvezetői közreműködéssel ✓
- napi tájékoztatók ✓

Munkaterület állapota a mai napon

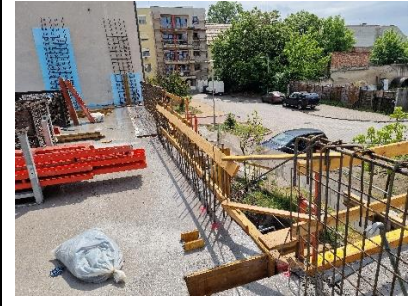
Értékelés módja kockázat alapú:

következmény valószínűség	nincs hatás, vagy a hatás jelentéktelen	könnyebb sérülést okoz	jelentős sérülést okoz	súlyos sérülést okoz	fokozottan súlyos vagy halálos kimenetelű
valószínűtlen	1	2	3	4	5
inkább nem fordul elő	2	4	6	8	10
lehetséges	3	6	9	12	15
valószínűleg előfordul	4	8	12	16	20
elkerülhetetlen	5	10	15	20	25

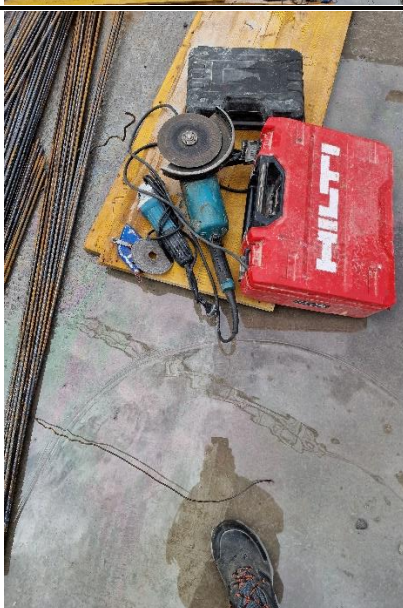
kockázati szint	végrehajtási határidő	
magas	azonnali	intézkedésig munka nem végezhető
közepes	rövid határidő	intézkedésig 1-3 nap türelmi idő engedélyezett, addig munka csak feltételekkel végezhető
alacsony	hosszabb határidő	a munkavégzés megengedett, intézkedni a következő bejárás, karbantartás, javítás alkalmáig kell (1 hét)

	kockázati szint	12	magas	1.
	veszély forrása	A hátsó részen felhalmozott maradék vasanyag található >2m mélység mellett		
	veszélyhelyzet	anyagmozgatás		
	megelőzés	A hátsó részen felhalmozott maradék vasanyag eltávolításakor a leesés veszélye miatt gondoskodni kell róla, hogy az ároknak háttal ne álljanak, valamint a szélét ne közelítsék meg! Megelőző intézkedés nélkül a folyamat nem végezhető el!		

Párta köz 4. BET	MUNKAVÉDELMI BEJÁRÁS ELLENŐRZÉSI jegyzőkönyv	7/B melléklet
---------------------	---	---------------

	határidő	pakolás megkezdése előtt	felelős	Monolit Lakásépítő
	szankció	nincs		
	visszaellenőrzés			
	kockázati szint	12	magas	2.
	veszély forrása	maradék faanyag található >2m mélység mellett		
	veszélyhelyzet	anyagmozgatás		
	megelőzés	A lábak bontása előtt a faanyagot el kell távolítani! A művelet teljes időtartama alatt gondoskodni kell róla, hogy a munkavállalók leesését megelőzzék, az anyagmozgatáshoz segédeszközöket biztosítsanak, a folyamatot megtervezzék! A botlásveszély miatt fokozott odafigyelésre van szükség.		
	határidő	pakolás megkezdése előtt	felelős	Monolit Lakásépítő
	szankció	nincs		
	visszaellenőrzés			
	kockázati szint	10	közepes	3.
	veszély forrása	kollektív védelem elégtelensége		
	veszélyhelyzet	a korlát felső deszkája alacsonyan van a test középpontjához képest, így nem tölti be feladatát		
	megelőzés	A korlátnak a padlószinttől 100cm-re kell felérnie. Amíg a technológiából adódóan ez a probléma fennáll, a kritikus pontokon ki kell egészíteni vagy a megközelítést kell korlátozni!		
	határidő	3 nap	felelős	Monolit Lakásépítő
	szankció	5 pont		
	visszaellenőrzés			
	kockázati szint	10	közepes	4.
	veszély forrása	kollektív védelem elégtelensége		
	veszélyhelyzet	a korlát felső deszkája alacsonyan van a test középpontjához képest, így nem tölti be feladatát		
	megelőzés			
	határidő	pakolás megkezdése előtt	felelős	Monolit Lakásépítő
	szankció	5 pont		
	visszaellenőrzés			
	kockázati szint	15	magas	5.
	veszély forrása	magasság		

Párta köz 4. BET	MUNKAVÉDELMI BEJÁRÁS ELLENŐRZÉSI jegyzőkönyv	7/B melléklet
-----------------------------	---	----------------------

	veszélyhelyzet	a födém szélén kapaszkodás nélkül létrán álló dolgozó megbillenve leesés elleni védelem nélkül marad		
	megelőzés	a födém szélén kollektív védelem nélkül maradt munkahelyzetben leesés ellen egyéni védelmet kell alkalmazni: energia elnyelő nélküli kötél és beülő heveder		
	határidő	azonnali	felelős	Monolit Lakásépítő
	szankció	10 pont		
	visszaellenőrzés			
	kockázati szint	9	közepes	6.
	veszély forrása	nyílás a födémen		
	veszélyhelyzet	a nyílásba lépve a láb sérülhet, a létra belecsúszva eldőlhethet		
	megelőzés	a nyílást le kell fedni, a létra lábát elcsúszás ellen rögzíteni kell		
	határidő	3 nap	felelős	Monolit Lakásépítő
	szankció	5 pont		
	visszaellenőrzés			
	kockázati szint	15	magas	7.
	veszély forrása	függő teher		
	veszélyhelyzet	teheremelés		
	megelőzés	emelésirányítás: gondoskodni kell róla, hogy a függő teher alatt ne tartózkodjanak		
	határidő	azonnali	felelős	Monolit Lakásépítő
	szankció	10 pont		
	visszaellenőrzés			
	kockázati szint	9	közepes	8.
	veszély forrása	nedvesség		
	veszélyhelyzet	elektromos szerszám használata víz közelében		
	megelőzés	elektromos szerszámok csak száraz környezet biztosításával, száraz lábon állva használhatók		
	határidő	3 nap	felelős	Monolit Lakásépítő
	szankció	5 pont		
	visszaellenőrzés			

	kockázati szint	9	közepes	9.
	veszély forrása	sérült munkaeszköz		
	veszélyhelyzet	szigetelés sérülés miatti áramütés		
	megelőzés	az elektromos eszközök sérült szigetelését meg kell javítani		
	határidő	3 nap	felelős	Monolit Lakásépítő
	szankció	5 pont		
	visszaellenőrzés			

Amennyiben visszaellenőrzésig a hiba nem kerül kijavításra, a szankció pénzügyi levonásként érvényesítésre kerül!
